



CONTROL DE VOLUMENES DIARIO TRANSPORTADO Y ENTREGADO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA ACUEDUCTO LA ESPERANZA - REFINERÍA DEL PACÍFICO


GERENCIA TÉCNICA (Unidad: Operación y Mantenimiento)

Revisión: Fecha: 29/12/2023 Página: 1 de 1

Main data table with columns for FECHA Y HORA LECTURA, RESUMEN DE RESULTADOS DIARIOS, ESTACIÓN DE BOMBEO LA ESPERANZA, DERIVACIÓN JARAMILLO, DERIVACIÓN MANTA, DERIVACIÓN MONTECRISTI, and VOLUMEN CAPTADO POR AGRICULTORES. Includes sub-totals for consumption and delivery percentages.


RESUMEN DIARIO: 31 AGOSTO 2024 VOLUMEN TRANSPORTADO Y ENTREGADO

Summary table for August 31, 2024, showing 2 items: Derivaciones Municipales (2,647 m3, 2.6%) and Agrícolas (96,871 m3, 97.4%).

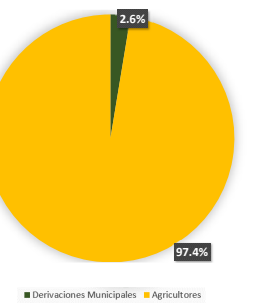


RESUMEN MENSUAL: AGOSTO 2024 VOLUMEN TRANSPORTADO Y ENTREGADO

Summary table for August 2024, showing 4 items: Derivación Manta (0 m3, 0.0%), Derivación Jaramiljo (56,081 m3, 1.9%), Derivación Montecristi (95,252 m3, 3.2%), and Agrícolas (2,866,730 m3, 95.0%).



RESUMEN ACUMULADO: DESDE INICIO DE OPERACIONES VOLUMEN TRANSPORTADO Y ENTREGADO

Summary table for cumulative data, showing 4 items: Derivación Manta (35,704,788 m3, 19.7%), Derivación Jaramiljo (15,504,471 m3, 8.6%), Derivación Montecristi (13,270,812 m3, 7.3%), and Agrícolas (116,584,826 m3, 64.4%).



COMUNICACIÓN DE NOVEDADES

Table of incidents with columns for FECHA, DESCRIPCIÓN, and details of system events and resolutions.

18/07/24 17:03	Se produce pérdida de comunicación entre el sistema SCADA y Derivaciones. La comunicación retorna a las 17:04 horas
18/08/24 18:00	Alarma por filtro de succión presión de succión se mantuvo sobre nivel de (2,25 kgf/cm2) en tren de bombeo P-001A. Se reporta a mantenimiento para limpieza de filtro
18/08/24 18:00	Alarma por filtro de succión presión de succión se mantuvo sobre nivel de (2,16 kgf/cm2) en tren de bombeo P-001E. Se reporta a mantenimiento para limpieza de filtro
18/08/24 18:00	Alarma por filtro de succión presión de succión se mantuvo sobre nivel de (2,25 kgf/cm2) en tren de bombeo P-001F. Se reporta a mantenimiento para limpieza de filtro
19/08/24 8:49	Se realiza limpieza de filtros de succión de las bombas A, E y F por alarmas de bajo nivel. Trabajos se terminan a las 11:03 horas
19/08/24 12:43	Alarma por filtro de succión presión de succión se mantuvo sobre nivel de (2,43 kgf/cm2) en tren de bombeo P-001E. Se reporta a mantenimiento para limpieza de filtro
19/08/24 13:32	Alarma por filtro de succión presión de succión se mantuvo sobre nivel de (2,45 kgf/cm2) en tren de bombeo P-001A. Se reporta a mantenimiento para limpieza de filtro
19/08/24 18:50	La cámara CCTV-CAM-0011 del sistema emergente ubicada en la caminera de acceso a las bombas, se encuentra sin comunicación. No se puede acceder remotamente, se informa al grupo de operación y mantenimiento
20/08/24 9:01	Compresor cuarto de control bloqueado debido a baja presión. Se encuentra la unidad compresora apagada. Compresor bloqueado por baja presión debido a fuga de refrigerante. Personal de mantenimiento realiza revisión localmente pero no enciende
20/08/24 16:05	Aire acondicionado derivación Jaramijó no climatiza. El equipo se encontraba fuera de operación. El técnico detecta falla en tarjeta de control por cortocircuito provocado por la presencia de salamanquesas. Retiran la tarjeta para evaluación y posible arreglo reconstruyendo pistas dañadas y reemplazando componentes quemados
20/08/24 19:11	Se detecta ruido anormal en ventilador VS-0003 del cuarto de bombas por posible desalineamiento del motor, se reporta al área de O&M para revisión
22/08/24 8:16	Se realiza limpieza de filtros de succión de las bombas A, E y F por alarmas de bajo nivel. Trabajos se terminan a las 10:26 horas
25/08/24 10:32	El Operador de campo en recorrido por toma de datos reporta que la unidad evaporadora UMA-003, se encuentra con goteo de agua. Se reporta al grupo de operación y mantenimiento
27/08/24 9:33	Por petición de Planta Jaramijó, se procedió a cerrar la válvula FV-0101 derivación Jaramijó, por rotura en ducto secundario que va a Planta de tratamiento de agua cruda PTAP Jaramijó.
27/08/24 22:30	Operador de campo en recorrido por planta y toma de datos reportas que la unidad de A/C (895-UC-0018) del cuarto de controladores no climatiza adecuadamente. Se reporta a mantenimiento, se realiza chequeo previo de la unidad condensadora. La causa del mal funcionamiento es debido a contacto esporádico entre cable tierra y cable de línea. se deja a prueba dicha unidad.
28/08/24 20:40	La entrega de agua a derivación Jaramijó continua suspendida por daño en tubería secundaria hacia la PTAT.
28/08/24 22:00	La entrega de agua a derivación Jaramijó continua suspendida por daño en tubería secundaria hacia la PTAT.
30/08/24 8:39	Se realiza limpieza de filtros de succión de las bombas A, E y F por alarmas de bajo nivel. Trabajos se terminan a las 10:31 horas
31/08/24 9:41	La cámara CCTV-CAM-0010 del sistema emergente ubicada en la caseta de variadores, se encuentra sin comunicación. No se puede acceder remotamente, se informa al grupo de operación y mantenimiento
